

So ist der Arbeitsstand entstanden.

Vom Kundenbedarf über den Bau bis zur Prüfung. Historischer Ablauf und nächster Pilot bleiben getrennt.

📅 Stand 21.09.2026 📡 Lokales Lesepaket 🛡️ Keine Produktivfreigabe

Fünf Arbeitsschritte.



Was wann passiert ist.



24.07.2026

Bedarf und Erfassungswege

Mitarbeiter, Büro, Profi und externe Erfassung; Barcode-/Scanner-Konzept und Odoo-Bezug.

Fachliche Vorarbeit



30.07. / 03.08.2026

Betrieb und Zielversion

Das Kunden-Zielbild nennt Odoo 19. Der spätere Bestand verwendet 17/18.

Versionsentscheidung offen



14.–15.09.2026

Rohzeit, Rollen und Unterlagen

Prüfschritt vor der Buchung; Bestandsmasken, Markenunterlagen und Scannerformate.

Anforderungen und Material



15.–16.09.2026

Erste sichtbare Oberflächen

PWA-Zwischenstände und Brand-Studio als Gesprächsgrundlage.

Prototypen, keine Freigabe



19.–20.09.2026

Bauen, aufteilen und prüfen


Architektur, Modulzuschnitt, Aufträge, Gegenprüfung und Übergabe.

Aktive Entwicklungs- und Prüfphase

Quelle: S01 · S03

Wie lange die technischen Läufe dauerten.

Sechs historische Phasen

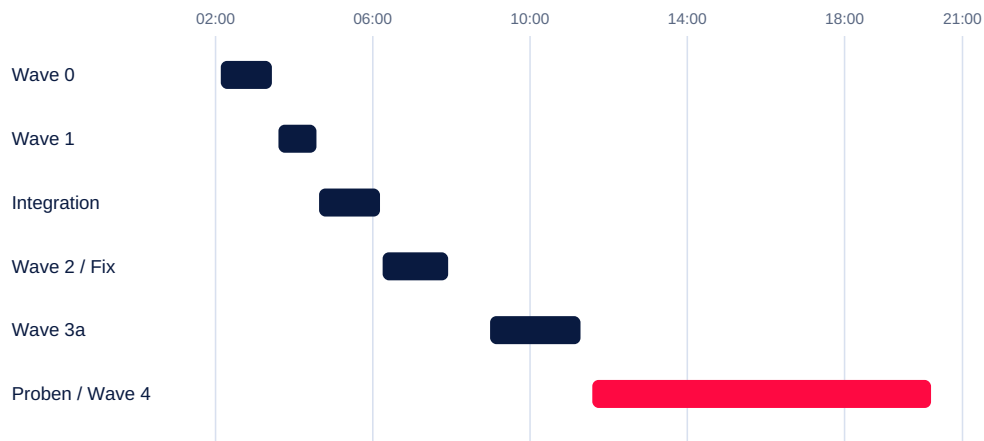

UTC am 20.09.2026 · erster bis letzter beobachteter Aufruf je Phase

Bridge-Pause 13:49–19:20 liegt im letzten Fenster. Keine aktive Arbeitszeit.

Beobachtete Zeitfenster in UTC am 20.09.2026; inklusive Pausen.

Quelle: S01

Die genauen Fenster und ihre Grenze

Phase	UTC	Einordnung
Wave 0	02:08–03:26	Erste Läufe, Freigabe-Stillstand
Wave 1	03:36–04:34	Parallele Aufträge; Peak sechs gleichzeitige Jobs
Integration	04:38–06:11	Zusammenführen, kein neues Einzelprodukt
Wave 2 / Fix	06:15–07:55 / 07:11–07:33	Folge- und Reparaturläufe
Wave 3a	08:59–11:17	Spätere Build-Läufe
Proben / Wave 4	11:35–20:12	Enthält die Bridge-Pause 13:49–19:20

Ein geführter Rundgang.



Geschäftsführung · etwa 5 Minuten

Ergebnis → Funktionsstand → Aufwand → Kosten → Risiko → Entscheidung. Die Dauer ist eine Leseempfehlung, keine gemessene Arbeitszeit.



IT-Leitung · etwa 30 Minuten

Fachablauf → Module → Demos → Nachweise → offene Fehler → Pilotprüfung. Jeder Schritt führt zu einer echten Unterseite.

Vorschlag: 14 Tage bis zur Pilotentscheidung.

Zeitraum	Arbeitsauftrag	Erwarteter Nachweis
Tag 1–2	Version, Umfang und Verantwortliche festlegen	Freigegebene Pilot-Prüfliste
Tag 3–5	Umgebung, Installation, Upgrade und Sicherheit prüfen	Protokolle; keine verdeckten Fehler
Tag 6–8	Scanner und Rollenfälle von Rohzeit bis Buchung testen	Nachvollziehbare Fachfälle, auch Duplikate und Fehler
Tag 9–11	Mit einer begrenzten Gruppe erproben	Nutzungs- und Zeitmessung, Fehlerliste
Tag 12–14	Ergebnisse, Kosten und Restarbeiten bewerten	Go/No-Go oder eingegrenzter Folgeauftrag



Planvorschlag, keine Terminusage: Der Start hängt von Gerätezugang, Testumgebung, Verantwortlichen und der Freigabe ab.

